๐๑๑รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนจังหวัดแพร่
(ส่วนราชการที่ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

<u>คำอธิบาย</u>

๑. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

๒. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงทุจริต วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการป้องกันการทุจริต ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

๓. เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๓

<u>ข้อมูลที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน</u>

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายจำนงค์ สุคันธมาลา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
มือถือ ๐๘๑-๙๙๓๘๔๘๔

๒. อธิบาย**แผนการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือน
- ตุลาคม ๒๕๖๒- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขออนุมัติแผนการเบิกจ่าย
- มีนาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เมษายน ๒๕๖๓ ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้าง
- พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งใบสำคัญเบิกจ่าย

๓. อธิบาย**ผลการดำเนินงาน** รอบ ๖ เดือนพร้อมภาพถ่ายประกอบ

การดำเนินการทำแนวกันไฟให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๑ การสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมทำแนวกันไฟและการกำหนดเส้นทางกันไฟ ทางผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด จำนวน ๑๒๒ กิโลเมตร

พื้นที่ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เสียงเพื่อป้องกันไฟป่าท้องที่จังหวัดแพร่
รวมระยะทาง ๑๒๒ กิโลเมตร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ป่าสงวนแห่งชาติ	บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง (กม.)
๑	ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก	นาปลากั้ง	๓	นาพูน	วังชิ้น	แพร่	๕
๒	ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง	นาอุ่นน่อง	๖	หัวทุ่ง	ลอง	แพร่	๕
๓	ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง	นาอุ่นน่อง	๗	หัวทุ่ง	ลอง	แพร่	๕
๔	ป่าแม่ปาน	ไทรย้อย	๑๒	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	๕
๕	ป่าแม่ปาน และป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน	น้ำพร้าว	๖	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	๕
๖	ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน	บ่อแก้ว	๔	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	๕
๗	ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน	บ่อแก้ว	๑๐	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	๕
๘	ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง	แม่ลอง	๔	บ่อเหล็กลอง	ลอง	แพร่	๕
๙	ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง	แม่จอก	๔	หัวทุ่ง	ลอง	แพร่	๕
๑๐	ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน	เปาปมดงยาง	๙	นาพูน	วังชิ้น	แพร่	๕

๑๑	ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน	แม่สิน	๙	นาพูน	วังชิ้น	แพร่	๕
๑๒	ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน	ไร่หลวง	๖	นาพูน	วังชิ้น	แพร่	๕
๑๓	ป่าแม่ยมตะวันตก	ห้วยขอน	๑๔	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่	๕
๑๔	ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย	บ้านใน	๖	ช่อแฮ	เมือง	แพร่	๕
๑๕	ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย	สันกลาง	๙	ป่าแดง	เมือง	แพร่	๕
๑๖	ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย	หนองแขม	๑๐	ป่าแดง	เมือง	แพร่	๕
๑๗	ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง	มหาโพธิ์	๕	ป่าแมต	เมือง	แพร่	๕
๑๘	ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง	วังหงษ์	๑	วังหงษ์	เมือง	แพร่	๕
๑๙	ป่าแม่เต๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง	ห้วยทรายขาว	๕	น้ำเลา	ร้องกวาง	แพร่	๕
๒๐	ป่าแม่เต๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง	บ้านอ้อย	๙	บ้านเวียง	ร้องกวาง	แพร่	๕
๒๑	ป่าแม่คำมี	ไผ่โทน	๒	ไผ่โทน	ร้องกวาง	แพร่	๕
๒๒	ป่าแม่คำมี	แม่กระทิง	๓	ไผ่โทน	ร้องกวาง	แพร่	๕
๒๓	ป่าแม่คำมี	ห้วยกี้	๑	ห้วยโรง	ร้องกวาง	แพร่	๕
๒๔	ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง	บ้านทุ่งเจริญ	๓	บ่อเหล็กลอง	ลอง	แพร่	๒
๒๕	ป่าแม่สอง	ท่อสมาน	๑๑	เตาปูน	สอง	แพร่	๕
รวมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น							**๑๒๒**

๒ แนวกันไฟต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ตามสภาพภูมิประเทศ และปริมาณเชื้อเพลิง





๓ ต้องกำจัดเชื้อเพลิงในแนวกันไฟออกให้หมด โดยแผ้วถาง เก็บริบ กวาดเศษวัชพืช หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นเชื้อเพลิง และเว้นลูกไม้และไม้ยืนต้นไว้







๔ ต้องริดกิ่ง ก้าน และใบบริเวณโคนต้นของต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่ ๑ เมตรขึ้นไปที่ขึ้นอยู่ในแนวกันไฟออก แนวกันไฟในพื้นที่ลาดชันต้องกว้างกว่าแนวกันไฟในพื้นที่ราบ บริเวณพื้นที่ที่มีปริมาณและความหน้าขอชั้นเชื้อเพลิงมาก แนวกันไฟต้องมีขนาดกว้างมากขึ้น





๕ จัดทำบันทึกค่าพิกัดแนวกันไฟเป็นแนวเส้นที่ดำเนินการในระบบ WGS ๑๙๘๔ แสดงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดรวมถึงจุดหักโค้งของแนวกันไฟเส้นนั้นๆ

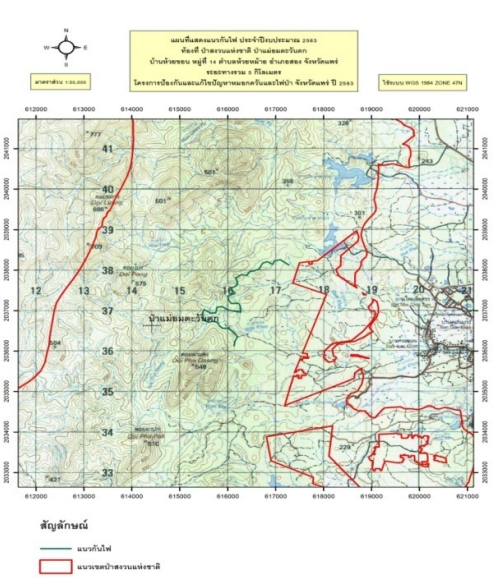

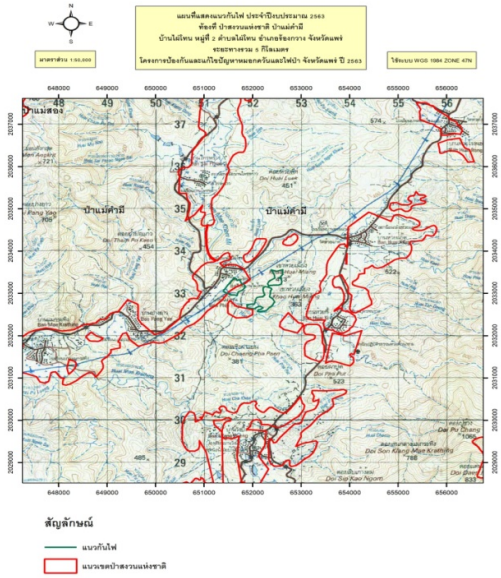

๖ ติดตั้งป้ายแสดงการดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ขนาด ๘๐ ซม. X ๑๒๐ ซม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือขาว โดยมีข้อความระบุชื่อโครงการ ความยาวเส้นแนวกันไฟ ชื่อ หมู่บ้าน ตำบล ที่ดำเนินการ





๔. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีล่าช้า ทำให้การดำเนินกิจกรรมมีทันช่วงฤดูกาลเกิดไฟป่า

๕. อธิบาย **แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

- ตุลาคม ๒๕๖๒- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขออนุมัติการแผนการเบิกจ่าย
- มีนาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- เมษายน ๒๕๖๓ ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้าง
- พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งใบสำคัญเบิกจ่าย ที่ ทส ๑๖๒๘.๕/๒๒๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖. อธิบาย **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ** รอบ ๖ เดือน

พร้อมสำเนาเอกสาร ประกอบด้วย **๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ**
๒) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

(ตามเอกสารแนบ ๑,๒,๓)

๗. อธิบาย **ปัญหา/อุปสรรค** ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการ ได้รับล่าช้าทำให้กิจกรรมของหน่วยงานดำเนินกิจงาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน

๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

-.....

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

.-.....

๑๐. อธิบาย **วิธีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

.-.....

๑๑. อธิบาย **ผลการป้องกันการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

.-.....

๑๒. อธิบาย **ข้อเสนอแนะ** ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

.-.....

****
