

ที่ พร ๐๐๒๒.๑ / ๖๗๕๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
๑๗๗ หมู่ ๒ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๒/ว๔๐๕๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแพร่แจ้งให้หน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการตามแนวทางฯ ส่งให้จังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งทางเอกสารและไฟล์เอกสารที่สามารถแก้ไขได้ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phrae_pro@hotmail.com นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๘๐๐ เมตร วงเงินตามสัญญา ๔๐,๗๗๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว ๑๖๕ เมตร วงเงินตามสัญญา ๑๔,๒๘๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๓๐๐ เมตร วงเงินตามสัญญา ๑๙,๙๖๕,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิภัทร ปาละนันทน์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๖๔ ๙๓๒๗ , ๐ ๕๔๖๔ ๙๘๐๓

แนวทางการทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สาระสำคัญ

๑. **ชื่อโครงการ** บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
จำนวน ๓ กิจกรรมย่อย

๒. **หน่วยดำเนินการ** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

๓. **งบประมาณ**

๓.๑ ใช้จ่ายงบประมาณ ๗๕,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๒ งบประมาณเหลือจ่าย บาท

๓.๓ ส่งคืนงบประมาณ บาท

เนื่องจาก

๔. **วัตถุประสงค์**

๔.๑ เพื่อลดปัญหาการพังทลายของดินและป้องกันการเกิดอุทกภัย

๔.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๕. **ผลการดำเนินงาน**

ผลสำเร็จ หรือประโยชน์ที่ได้รับ เช่น จำนวนคน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ถนน (สาย, ระยะทาง) และอื่น ๆ

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๔๐,๗๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๕๐๐ วัน วันเริ่มต้น ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานก่อสร้าง ร้อยละ ๓.๙๒ ผลงานก่อสร้าง ร้อยละ ๓.๙๘ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๐๖ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๖.๕๐ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๑๕ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๓๑.๕๐ จำนวนวันที่ใช้ไป ๑๔๙ วัน หรือร้อยละ ๒๙.๘๐ คงเหลือ ๓๕๑ วัน หรือร้อยละ ๗๐.๒๐

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว ๑๖๕ เมตร งบประมาณ ๑๖,๓๑๒,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๑๔,๒๘๗,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐๐ วัน วันเริ่มต้น ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานก่อสร้าง ร้อยละ ๗๕.๖๒ ผลงานก่อสร้าง ร้อยละ ๓๙.๔๓ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๓๖.๑๙ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๘.๒๕ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๐ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๖๘.๒๕ จำนวนวันที่ใช้ไป ๒๔๒ วัน หรือร้อยละ ๘๐.๖๗ คงเหลือ ๕๘ วัน หรือร้อยละ ๑๙.๓๓

กิจกรรมย่อยที่ ๓...

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๑๙,๙๖๕,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๔๘๑ วัน วันเริ่มต้น ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุด ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แผนงานก่อสร้าง ร้อยละ ๖๒.๘๖ ผลงานก่อสร้าง ร้อยละ ๐.๕๒ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖๒.๓๔ แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๑.๙๓ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๐ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๕๑.๙๓ จำนวนวันที่ใช้ไป ๑๙๖ วัน หรือร้อยละ ๔๐.๗๕ คงเหลือ ๒๘๕ วัน หรือร้อยละ ๕๙.๒๕

๖. การบรรลุตามตัวชี้วัด


ที่	ตัวชี้วัดตามโครงการ	ผลลัพธ์ที่ได้
๑	จำนวนแหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟู/สร้างใหม่ อย่างน้อย ๒ แห่ง หรือไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๓ แห่ง ความยาวรวม ๑,๒๖๕ เมตร

๗. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กิจกรรมย่อยที่ ๑ มีการเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง และระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างและประชุมหารือระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นระยะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒ และ ๓ มีการแก้ไขแบบรูปรายการให้สอดคล้องตามสภาพข้อเท็จจริง ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง และระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการแจ้งเร่งรัดการก่อสร้างและประชุมหารือระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน เป็นระยะ

๘. ภาพประกอบการดำเนินงาน จำนวน ๓ – ๖ ภาพ พร้อมคำอธิบายใต้ภาพ (พอสังเขป)

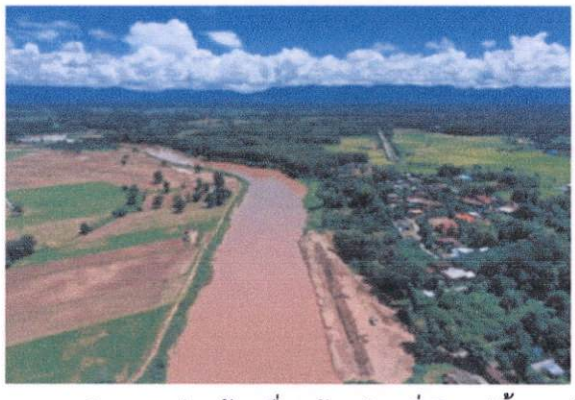




กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

กิจกรรมก่อสร้าง...



กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังวน หมู่ที่ ๓ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)

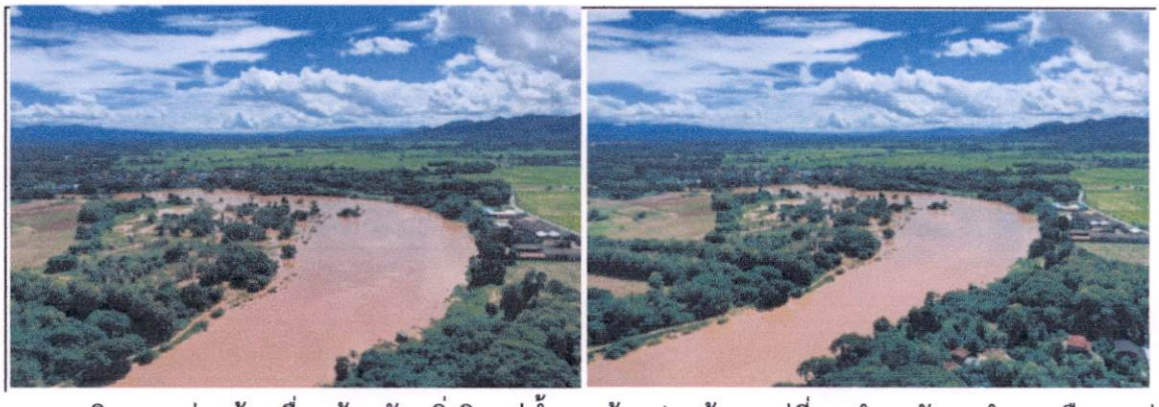

กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
